BIJLAGE 1 | PLANNING

LET OP: deze planning is gebaseerd op de ideale situatie, zonder de onvoorziene invloed van omgevingsfactoren/ weersomstandigheden en werkzaamheden van derden. Leest u deze planning als een realistische richtlijn voor de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden, maar houdt rekening met een mogelijke verschuiving van een aantal dagen.

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Reconstructie Treebord e.o - Reeuwijk Brug West**	**251 dagen**	**woe 3-4-19**	**vri 24-4-20**
2	**Contractdata**	**241 dagen**	**woe 17-4-19**	**vri 24-4-20**
3	Voorlopige gunning	1 dag	woe 17-4-19	woe 17-4-19
4	Definitieve gunning	1 dag	don 25-4-19	don 25-4-19
5	Startdatum contract	0 dagen	maa 27-5-19	maa 27-5-19
6	Opleverdatum contract	0 dagen	vri 24-4-20	vri 24-4-20
7	**Afsluitingen en restricties Contract**	**222 dagen**	**woe 3-4-19**	**zat 14-3-20**
8	Zwembad de Fuut	107 dagen	woe 3-4-19	maa 23-9-19
9	Niet opbreken Treebord t/m kruising Sterremos	91 dagen	woe 3-4-19	vri 30-8-19
10	Niet opbreken fietspad van zwembad tot Beugel 1	91 dagen	vri 26-4-19	maa 23-9-19
11	Niet opbreken voorterrein zwembad	91 dagen	vri 26-4-19	maa 23-9-19
12	Niet opbreken voetpad langs Treebord	91 dagen	vri 26-4-19	maa 23-9-19
13	Route Bouwverkeer	0 dagen	maa 1-7-19	maa 1-7-19
14	Dunantlaan tot 's-Gravenbroekseweg - start na 1-7-2019	0 dagen	maa 1-7-19	maa 1-7-19
15	Bruisend Reeuwijk	2 dagen	vri 6-9-19	maa 9-9-19
16	Afsluiting Dunantlaan	2 dagen	vri 6-9-19	maa 9-9-19
17	Triaton Gouden Waarden	1 dag	din 9-7-19	din 9-7-19
18	Start Zwembad de Fuut - geen werkzaamheden	1 dag	din 9-7-19	din 9-7-19
19	Reeuwijkse Plasseniloop	1 dag	zat 14-3-20	zat 14-3-20
20	Parcours Oudeweg - geen werkzaamheden	1 dag	zat 14-3-20	zat 14-3-20
21	**Werkvoorbereiding**	**5 dagen**	**vri 26-4-19**	**don 2-5-19**
22	Kwaliteitplan opstellen	5 dagen	vri 26-4-19	don 2-5-19
23	Coordinatie en afstemming Nutspartijen	5 dagen	vri 26-4-19	don 2-5-19
24	Algemeen tijdschema opstellen	5 dagen	vri 26-4-19	don 2-5-19
25	Plan omgang vrijkomende materialen opstellen	5 dagen	vri 26-4-19	don 2-5-19
26	**Omgevingsmanagement**	**13 dagen**	**vri 26-4-19**	**din 14-5-19**
27	Bewonersavond	1 dag	din 14-5-19	din 14-5-19
28	Schouw Flora en Fauna	2 dagen	vri 26-4-19	maa 29-4-19
29	Treffen mitigerende maatregelen	3 dagen	din 30-4-19	don 2-5-19
30	**Uitvoering**	**224 dagen**	**maa 13-5-19**	**don 23-4-20**
31	Per deelfase voeren we onderstaande werkzaamheden uit	9 dagen	maa 13-5-19	don 23-5-19
32	Graven proefsleuven	1 dag	maa 13-5-19	maa 13-5-19
33	Opbreken verharding incl. funderingslagen	2 dagen	din 14-5-19	woe 15-5-19
34	Aanbrengen riool incl. grondwerk	3 dagen	don 16-5-19	maa 20-5-19
35	Aanbrengen straatwerk	3 dagen	din 21-5-19	don 23-5-19
36				
37	Verwijderen groen (bomen en struiken)	5 dagen	maa 27-5-19	vri 31-5-19
38	Inrichten depotruimte	5 dagen	maa 27-5-19	vri 31-5-19
39	**Deelfases**	**209 dagen**	**maa 3-6-19**	**don 23-4-20**
40	Deelfase A	5 dagen	maa 3-6-19	vri 7-6-19
41	Deelfase B	8 dagen	din 11-6-19	don 20-6-19
42	Deelfase C	9 dagen	vri 21-6-19	woe 3-7-19
43	Deelfase D	12 dagen	don 4-7-19	vri 19-7-19
44	Deelfase E	5 dagen	maa 22-7-19	vri 26-7-19
45	Deelfase F	10 dagen	maa 29-7-19	maa 4-11-19
46	Deelfase G (incl. 10 dagen nutswh)	15 dagen	maa 8-7-19	vri 26-7-19
47	Deelfase H (incl. 10 dagen nutswh)	15 dagen	maa 1-7-19	vri 19-7-19
48	Deelfase I (incl. 10 dagen nutswh)	15 dagen	vri 14-6-19	don 4-7-19
49	Deelfase J	6 dagen	maa 21-10-19	maa 28-10-19
50	Deelfase K	5 dagen	maa 14-10-19	vri 18-10-19
51	Deelfase L	10 dagen	maa 26-8-19	vri 6-9-19
52	Deelfase M	3 dagen	woe 9-10-19	vri 11-10-19
53	Deelfase N	2 dagen	maa 7-10-19	din 8-10-19
54	Deelfase O	5 dagen	maa 30-9-19	vri 4-10-19
55	Deelfase P	5 dagen	maa 23-9-19	vri 27-9-19
56	Deelfase Q	5 dagen	maa 16-9-19	vri 20-9-19
57	Deelfase R	3 dagen	woe 11-9-19	vri 13-9-19
58	Deelfase S	2 dagen	maa 9-9-19	din 10-9-19
59	Deelfase T	12 dagen	din 5-11-19	woe 20-11-19
60	Deelfase U	15 dagen	don 21-11-19	woe 11-12-19
61	Deelfase V	13 dagen	maa 6-1-20	woe 22-1-20
62	Deelfase W	20 dagen	don 23-1-20	woe 19-2-20
63	Deelfase X	5 dagen	don 20-2-20	woe 26-2-20
64	Deelfase Y	8 dagen	don 27-2-20	maa 9-3-20
65	Deelfase Z	12 dagen	din 10-3-20	woe 25-3-20
66	BUFFER Kerst	7 dagen	don 12-12-19	vri 20-12-19
67	BUFFER Einde werk	21 dagen	don 26-3-20	don 23-4-20

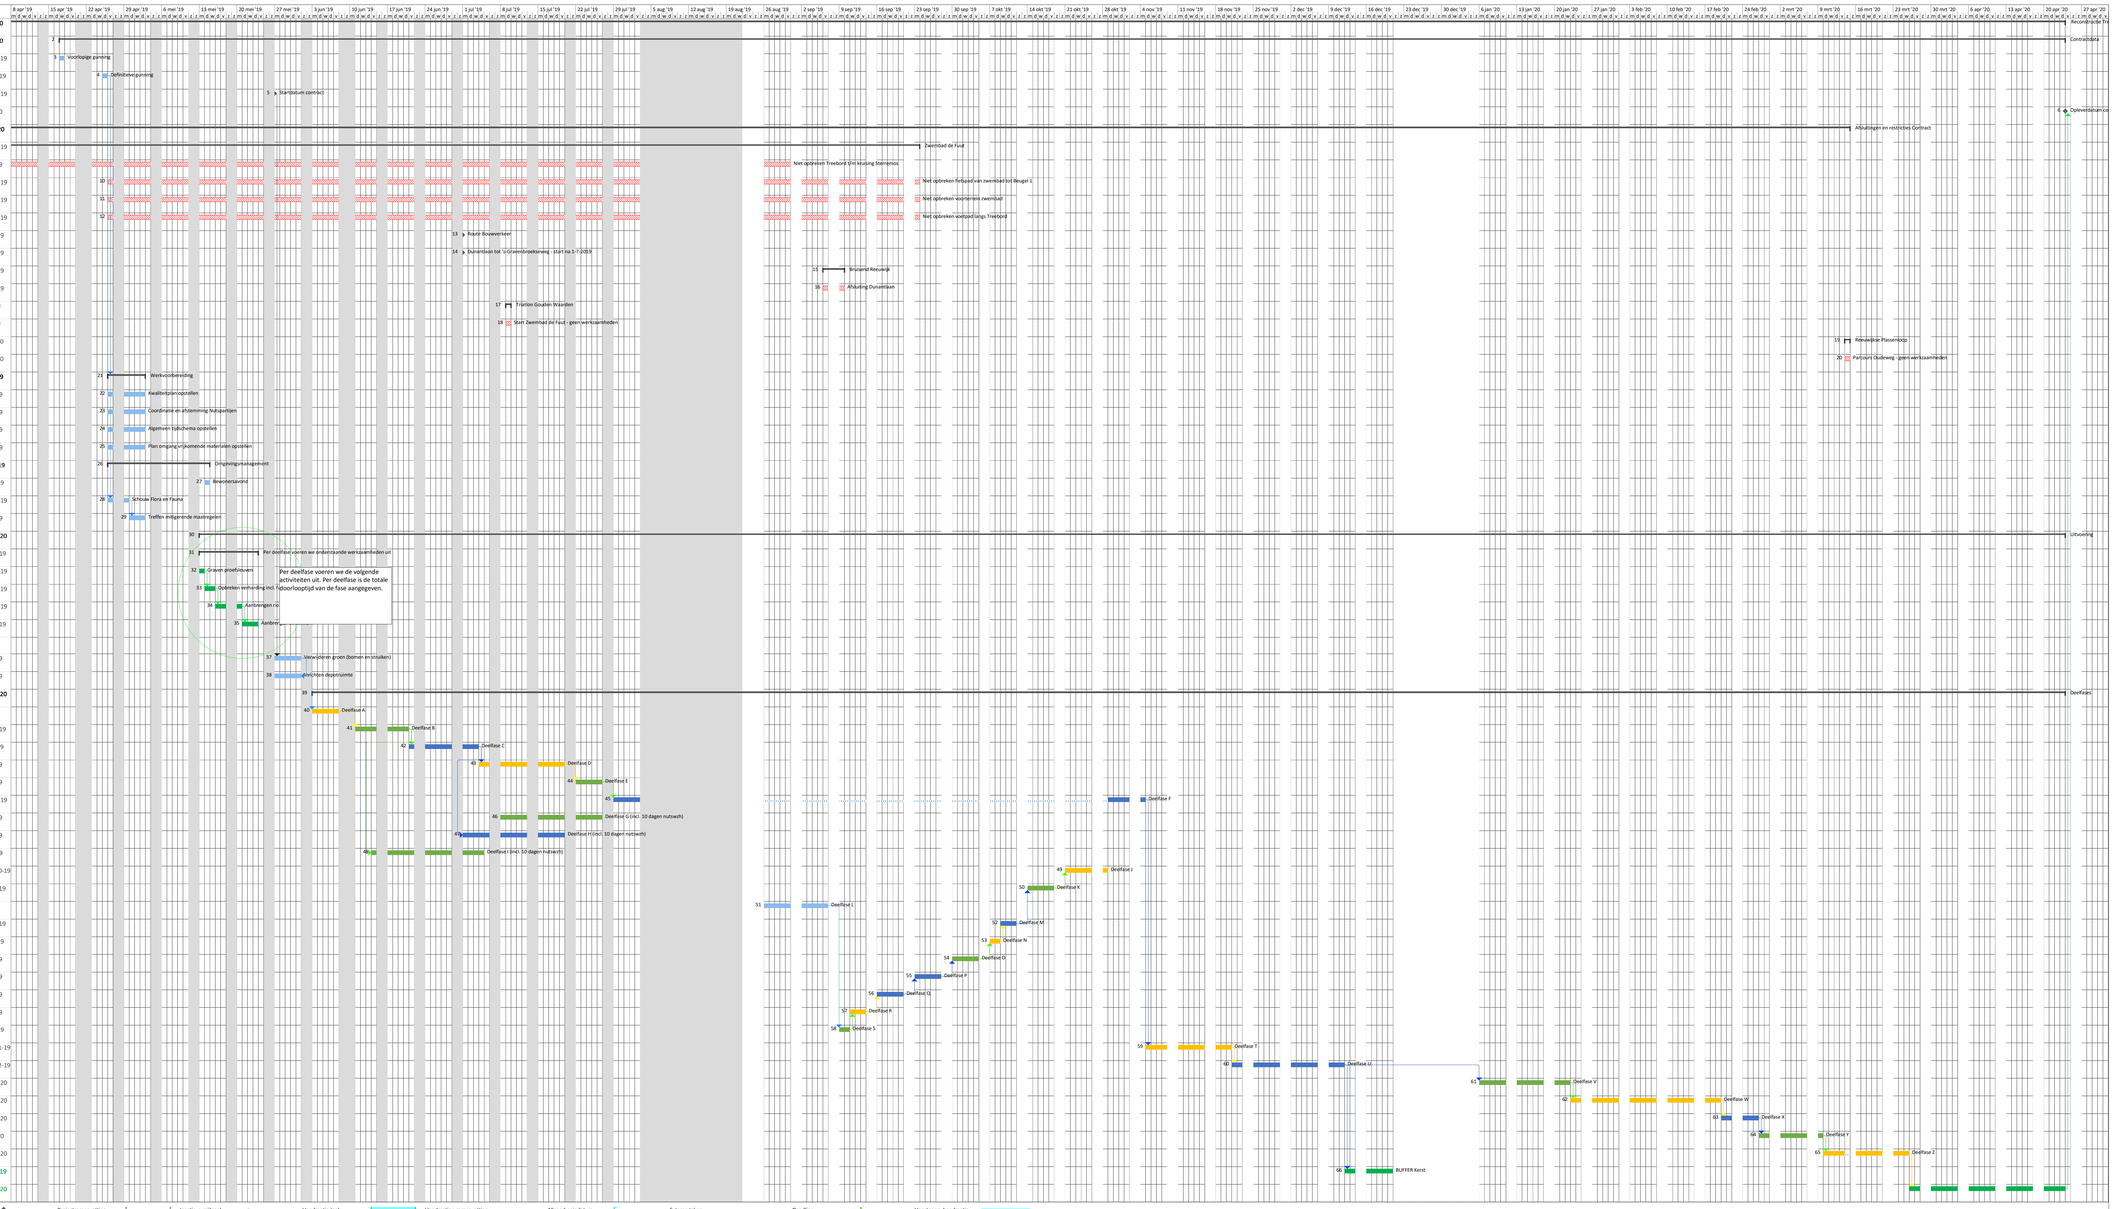

Project: Planning Treebord eo - Datum: don 28-3-19

Taak | Splitsing | Mijlpaal | Samenvatting | Projectsamenvatting | Inactieve taken | Inactieve mijlpaal | Inactieve samenvatting | Handmatig taak | Handmatige samenvatting | Handmatige samenvatting | Alleen duur | Alleen begindatum | Alleen einddatum | Externe taken | Externe mijlpaal | Deadline | Voortgang | Voortgang, handmatig
